



Azienda sanitaria locale Avellino

COMUNE DI AVELLINO

**Progetto per la realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT)
presso la struttura sita in Via degli Imbimbo n.10/12 (AV).**

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

PROGETTISTA ARCHITETTONICO E
CSP-CSE:

arch. Gerardo GETULI



DIREZIONE LAVORI:

Tav. **EC.06**

IMPRESA ESECUTRICE:

CRONOPROGRAMMA

EC

ELABORATI TECNICO ECONOMICI

DIRETTORE GENERALE:

Dott. Mario FERRANTE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Antonio CAGGIANO

APPROVATO:

Avellino: Anno 2022

Comune di Avellino

Provincia di Avellino

RELAZIONE CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT) presso la struttura sita in Via degli Imbimbo n. 10/12 (AV)

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino

Il Tecnico
(Arch. Gerardo Getuli)

Comune di Avellino

Provincia di Avellino

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT) presso la struttura sita in Via degli Imbimbo n. 10/12 (AV)

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino

RELAZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **120** giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.


In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.

Il Tecnico
(Arch. Gerardo Getuli)

[illegible]

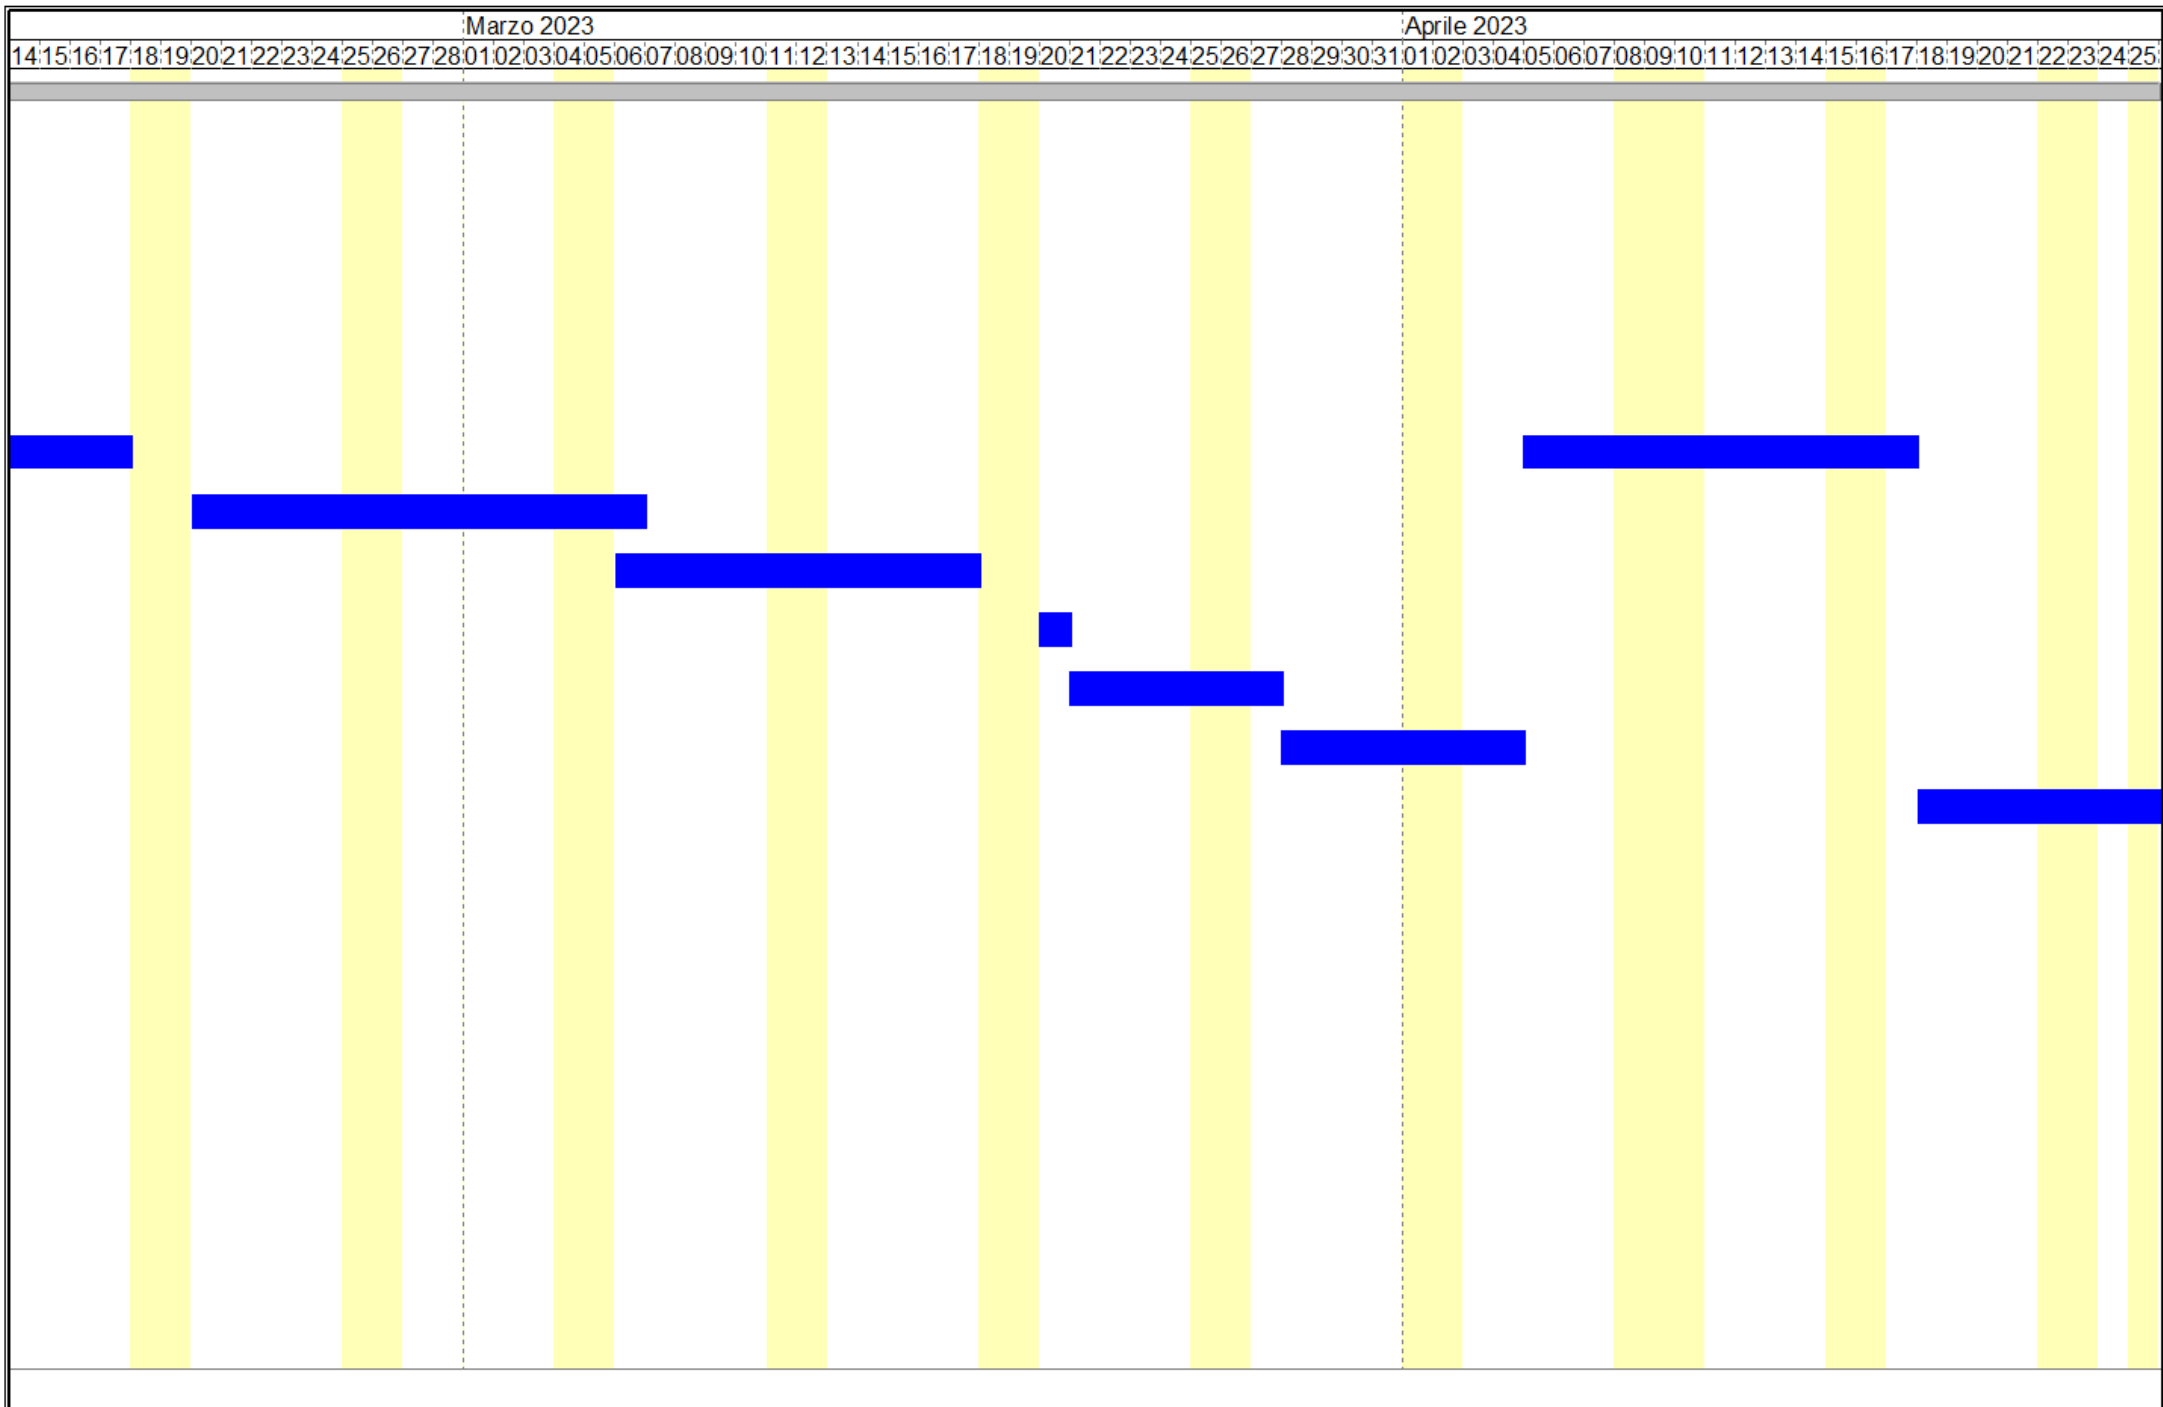

The image shows a calendar for the months of May, June, and July 2023. The dates are arranged in a grid. A grey bar is positioned at the top left, and a blue bar is on the left side. The calendar is mostly empty, with only a few dates visible.
