



**Azienda Sanitaria Locale  
AVELLINO  
U.O.C. Tecnico Patrimoniale**



ingegneria | architettura | geologia

Sede legale: Via Gramsci 10, 81057 Teano (CE)  
Sede Operativa: piazza Aldo Moro snc, Teano (CE)  
Partita IVA: 04498670613  
tel/fax: 0823875704  
mobile: 3408268240 3807194974 3496692960  
e-mail: diastilosrl@gmail.com;  
Posta certificata: diastilosrl@pec.it

**R.U.P.**

**ing. Antonino SIRIGNANO**

committente

**ing. Francesco D' ORTA**

direttore tecnico

**arch. ANTONIO DIANA**

direttore tecnico

**ing. Antonio STRUFFOLINO**

direttore tecnico

progetto definitivo ☐ progetto esecutivo ☒

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE  
DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO "PNRR MISSIONE 6 COMPONENTE 1  
SEZIONE 1.2.2 IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI" - (COT DI MONTEFORTE)**

**CRONOPROGRAMMA**

elaborato

**E.05**

data

**GENNAIO  
2023**

scala

redatto **AD**

verificato **AS**

validato **FD**

revisione **REV.**

DESCRIZIONE	VALORE
<div>Tipologia Documento</div> <div>Comune</div> <div>Provincia</div> <div>Oggetto</div> <div>Committente</div> <div>Tecnico</div> <div>Impresa</div> <div>Luogo</div> <div>Data</div> <div>Importo per l'emissione dei SAL</div>	<div>Cronoprogramma di progettazione</div> <div>Comune di Monteforte Irpino</div> <div>Provincia di Avellino</div> <div>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.)</div> <div>Azienda Sanitaria Locale di Avellino</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>30.000,00 €</div>

**Comune di Monteforte Irpino**

**Provincia di Avellino**

# **RELAZIONE CRONOPROGRAMMA**

**OGGETTO:** LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA  
TERRITORIALE (C.O.T.)

**COMMITTENTE:** Azienda Sanitaria Locale di Avellino

Il Tecnico

---

# Comune di Monteforte Irpino

## Provincia di Avellino

**OGGETTO:** LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.)

**COMMITTENTE:** Azienda Sanitaria Locale di Avellino

## RELAZIONE

### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

#### Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **240** giorni naturali e consecutivi.

#### Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

#### Tabella Climatico Ambientale:

condizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

### **Produzione mensile**

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 12'782,74 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 23'784,25 .

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.

Il Tecnico

**Comune di Monteforte Irpino**

**Provincia di Avellino**


**Cronoprogramma di  
PROGETTO**


**OGGETTO:** LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA  
TERRITORIALE (C.O.T.)

**COMMITTENTE:** Azienda Sanitaria Locale di Avellino


Il Tecnico

---

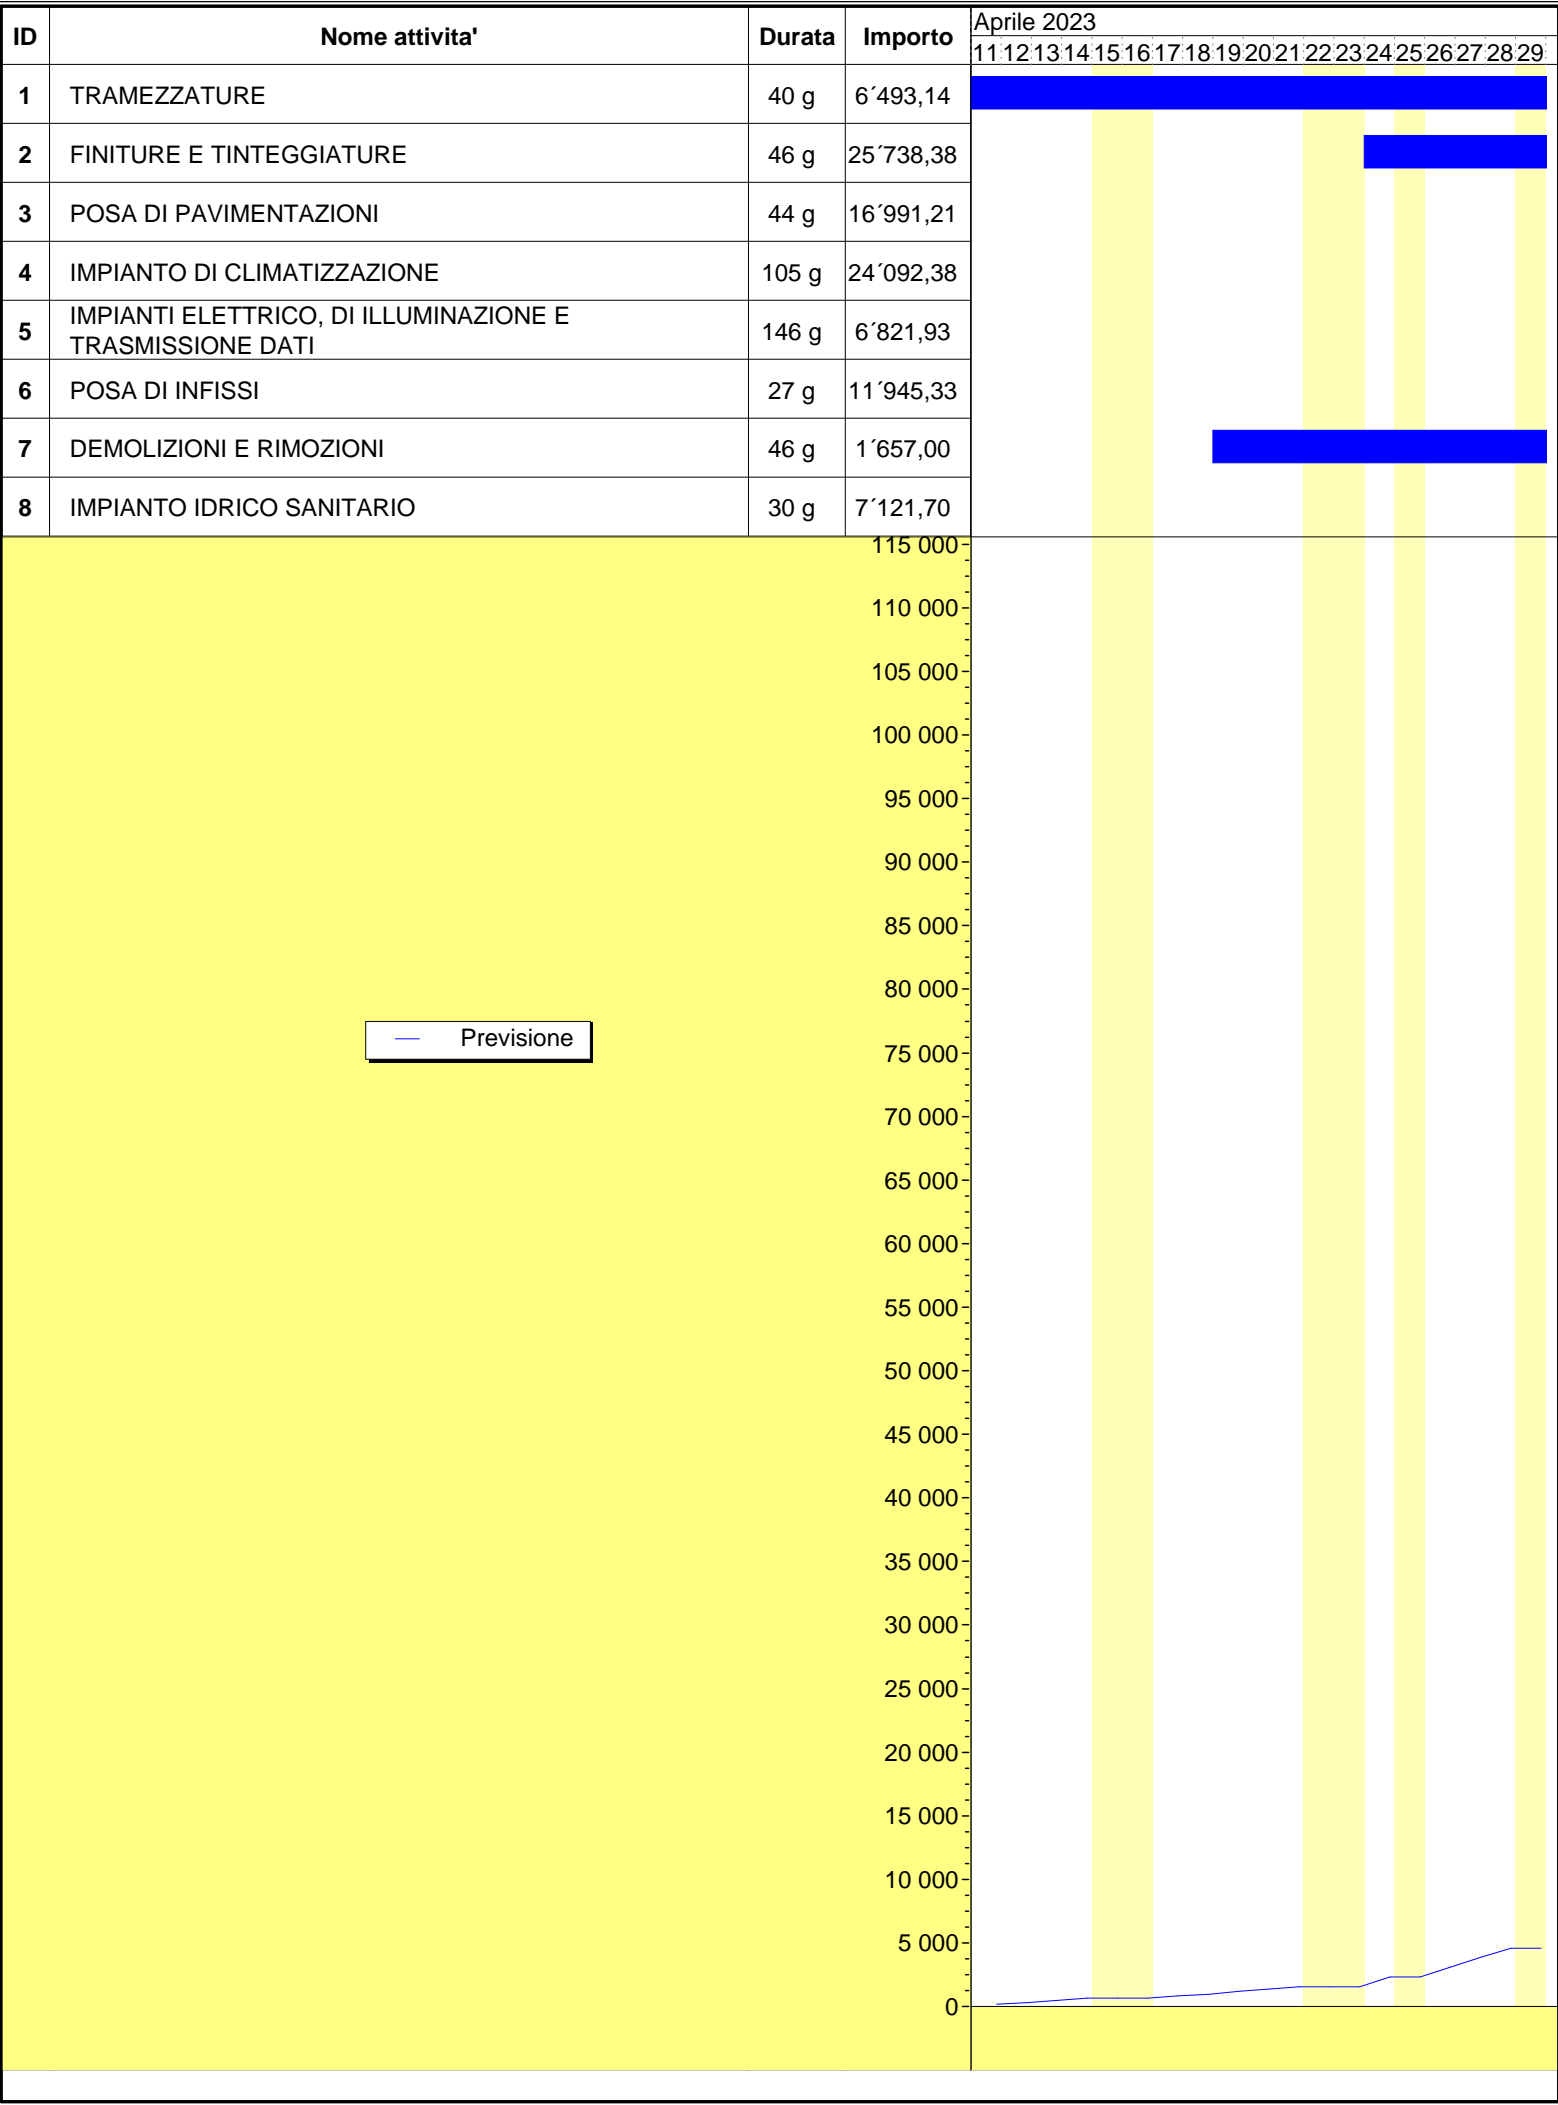

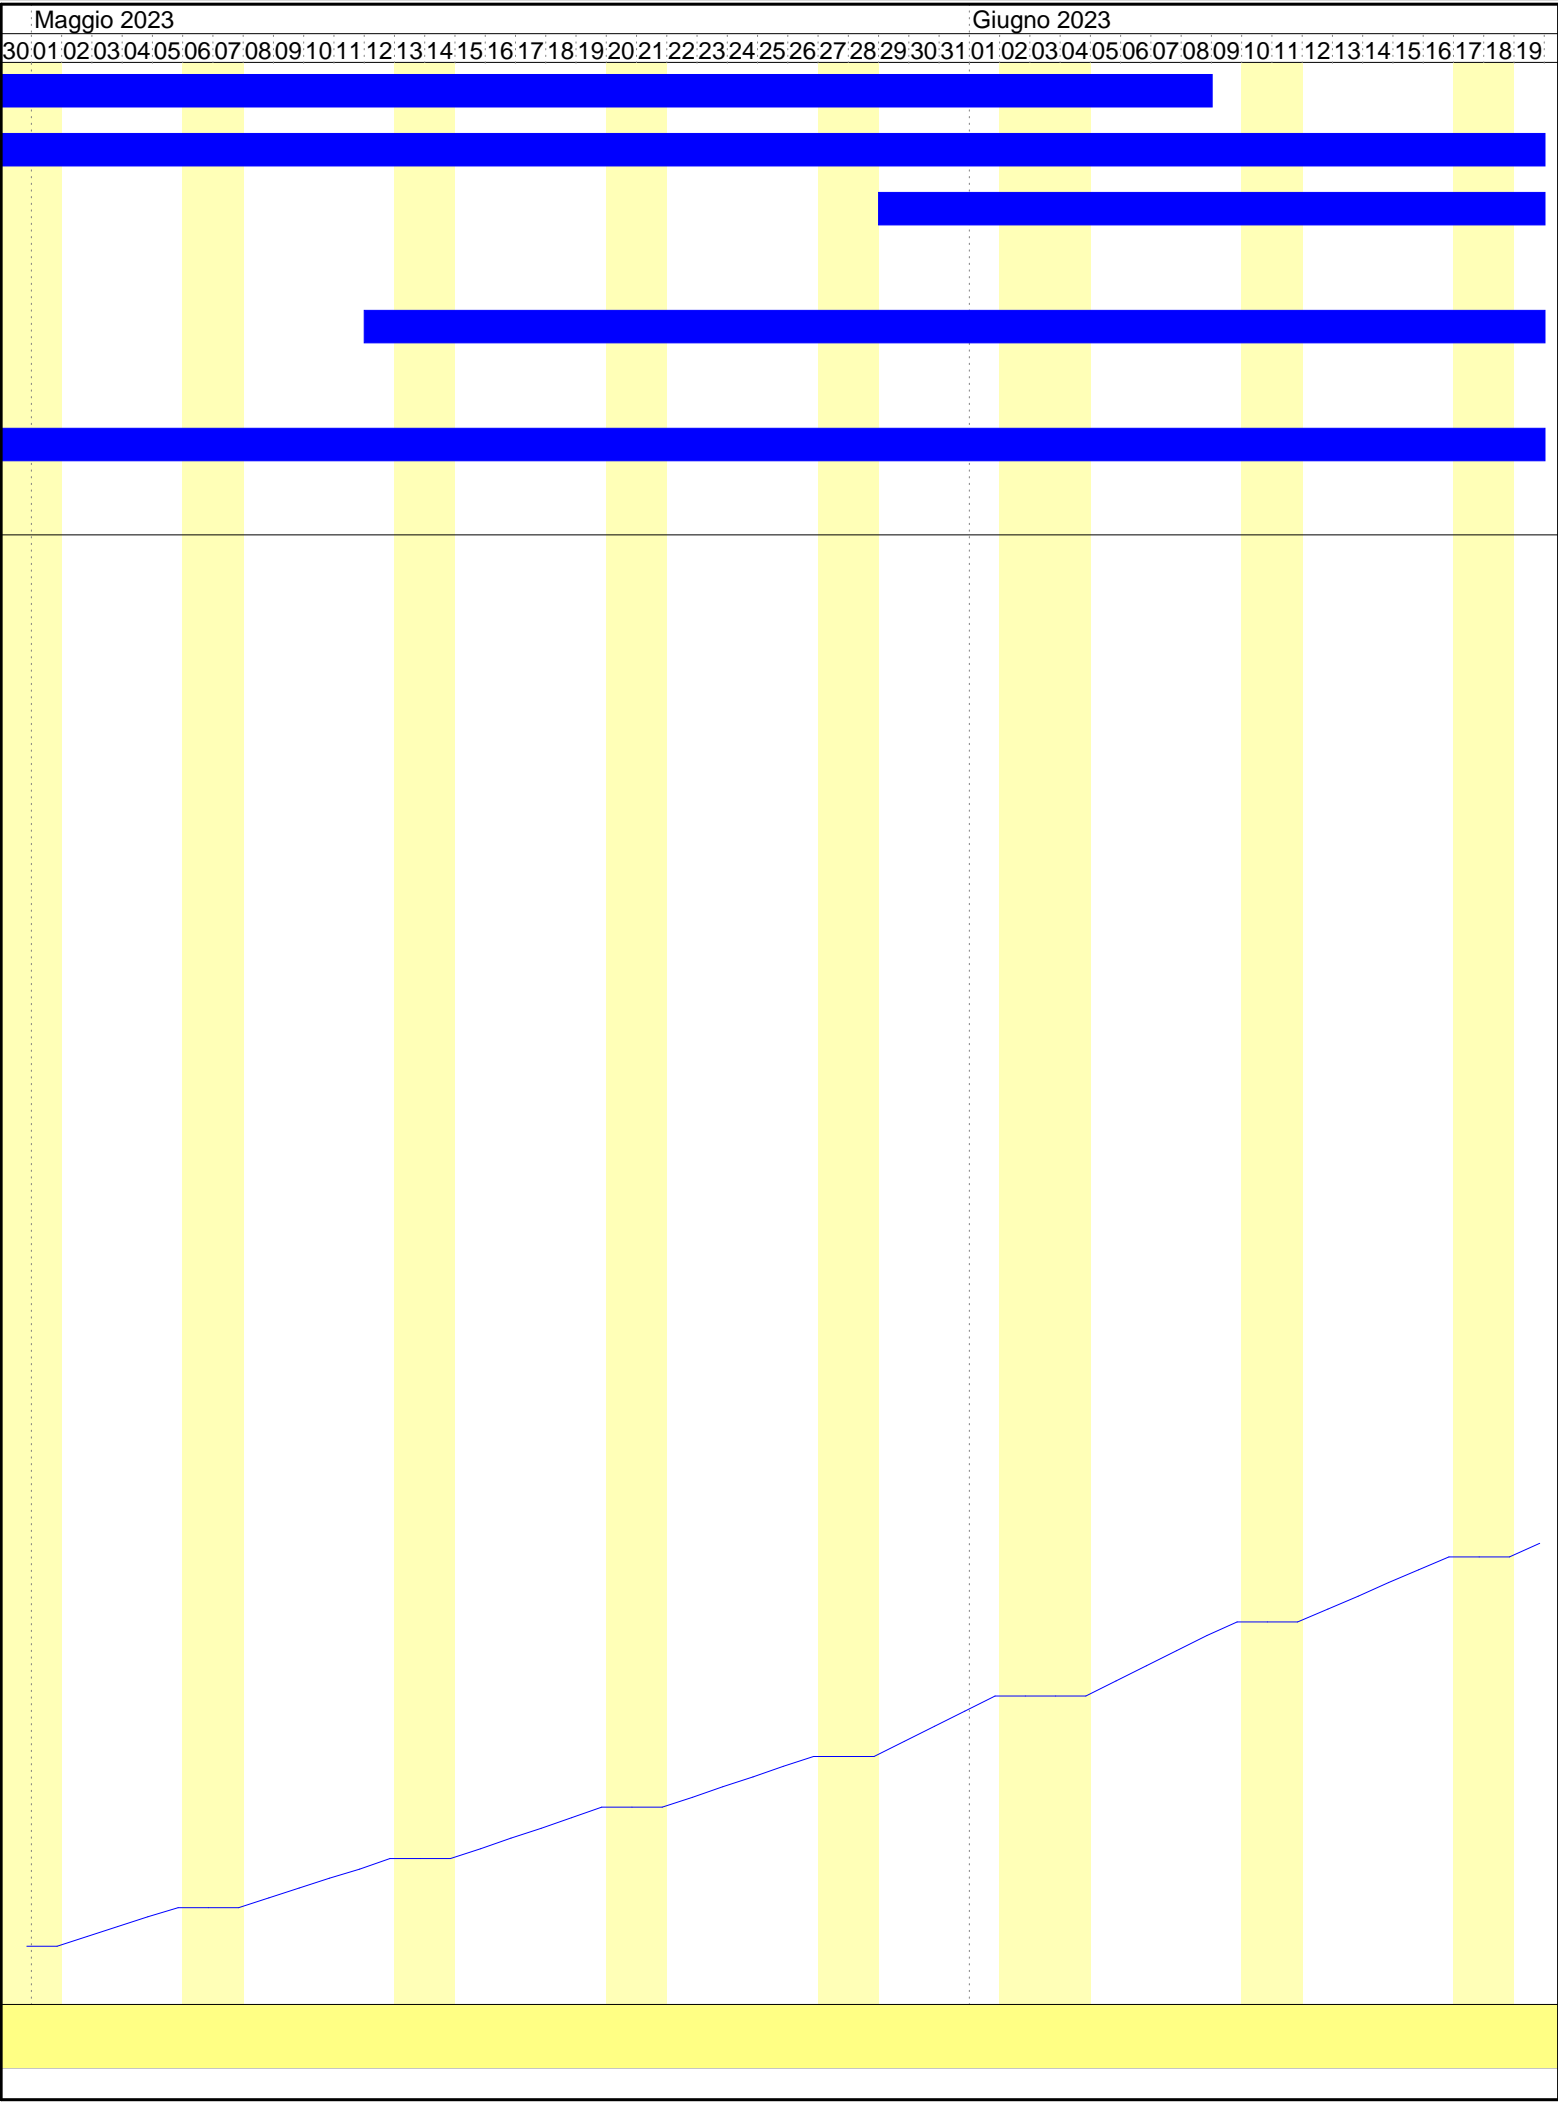





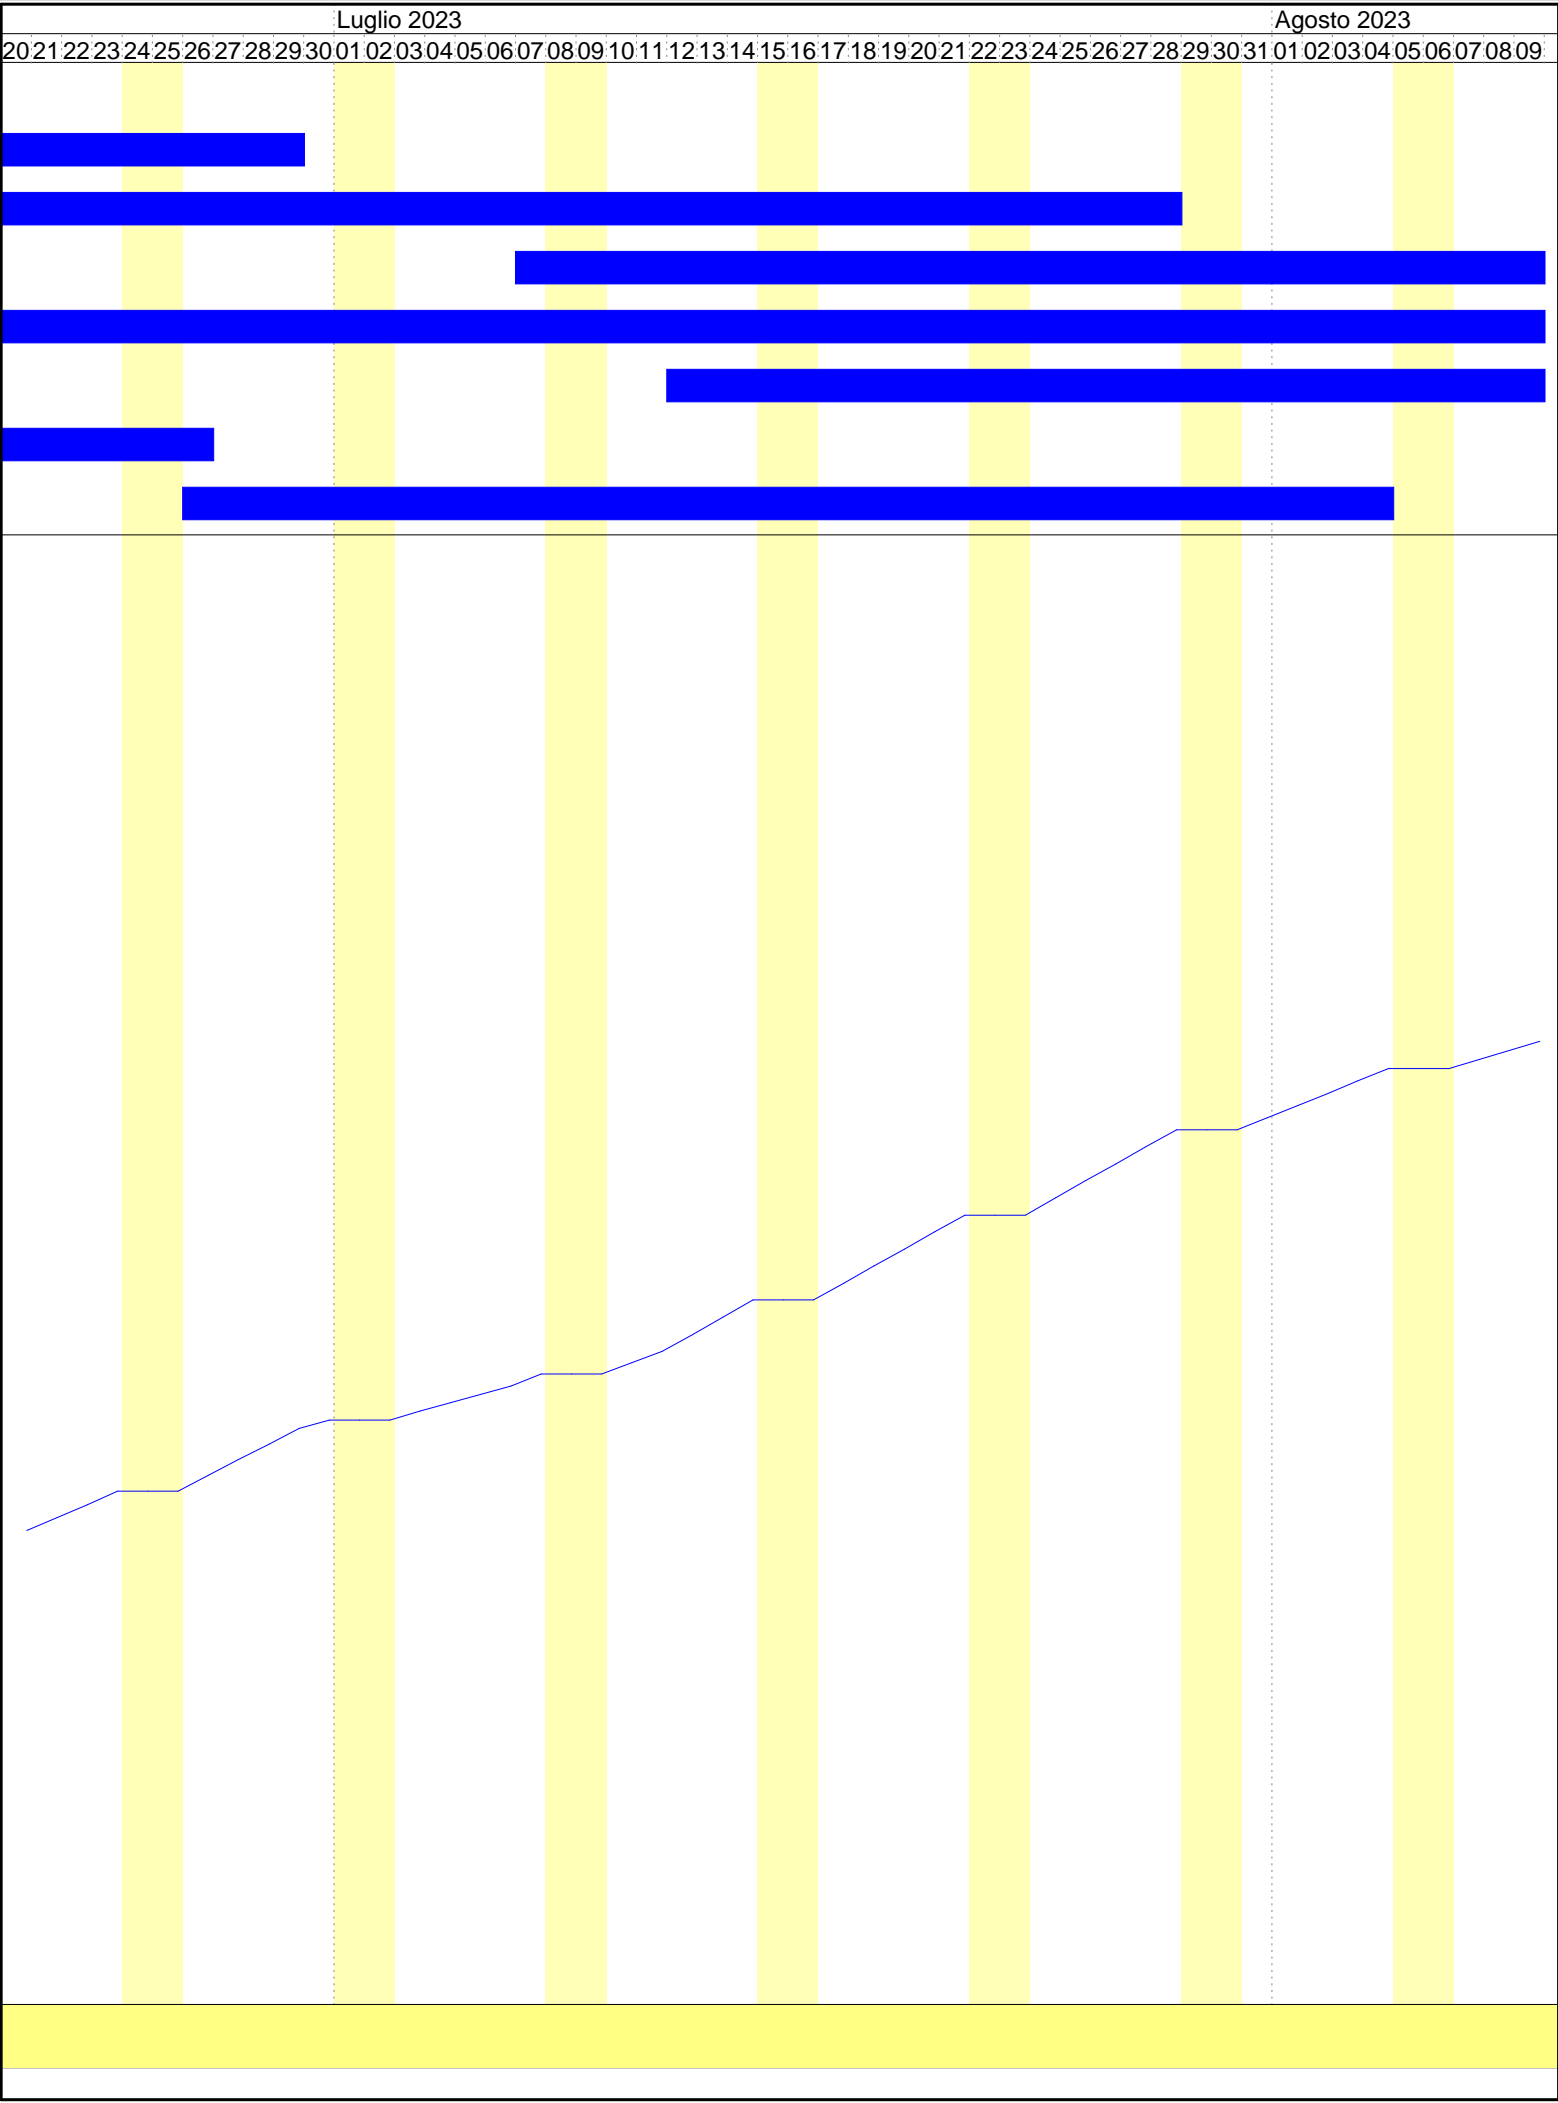

Settembre 2023

101112131415161718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829

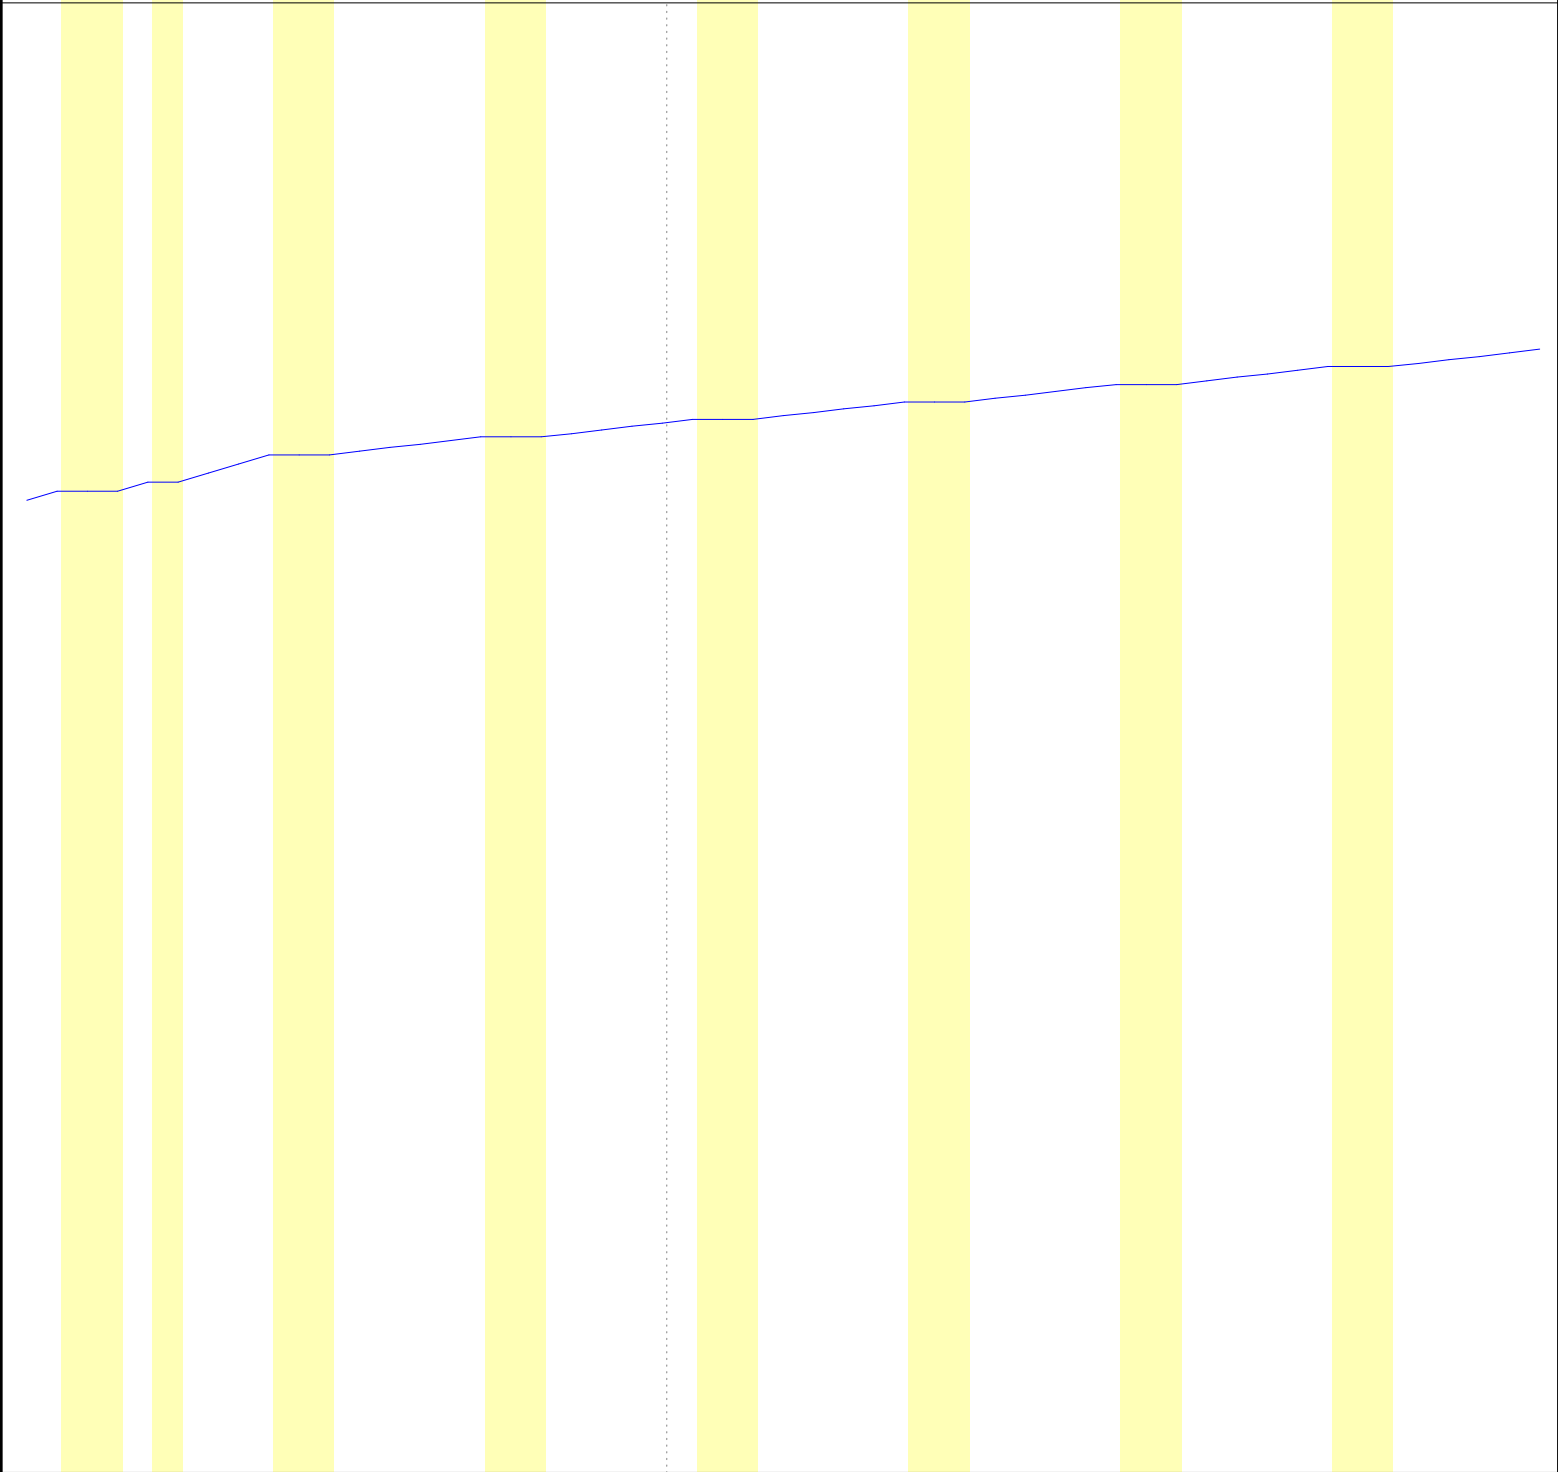

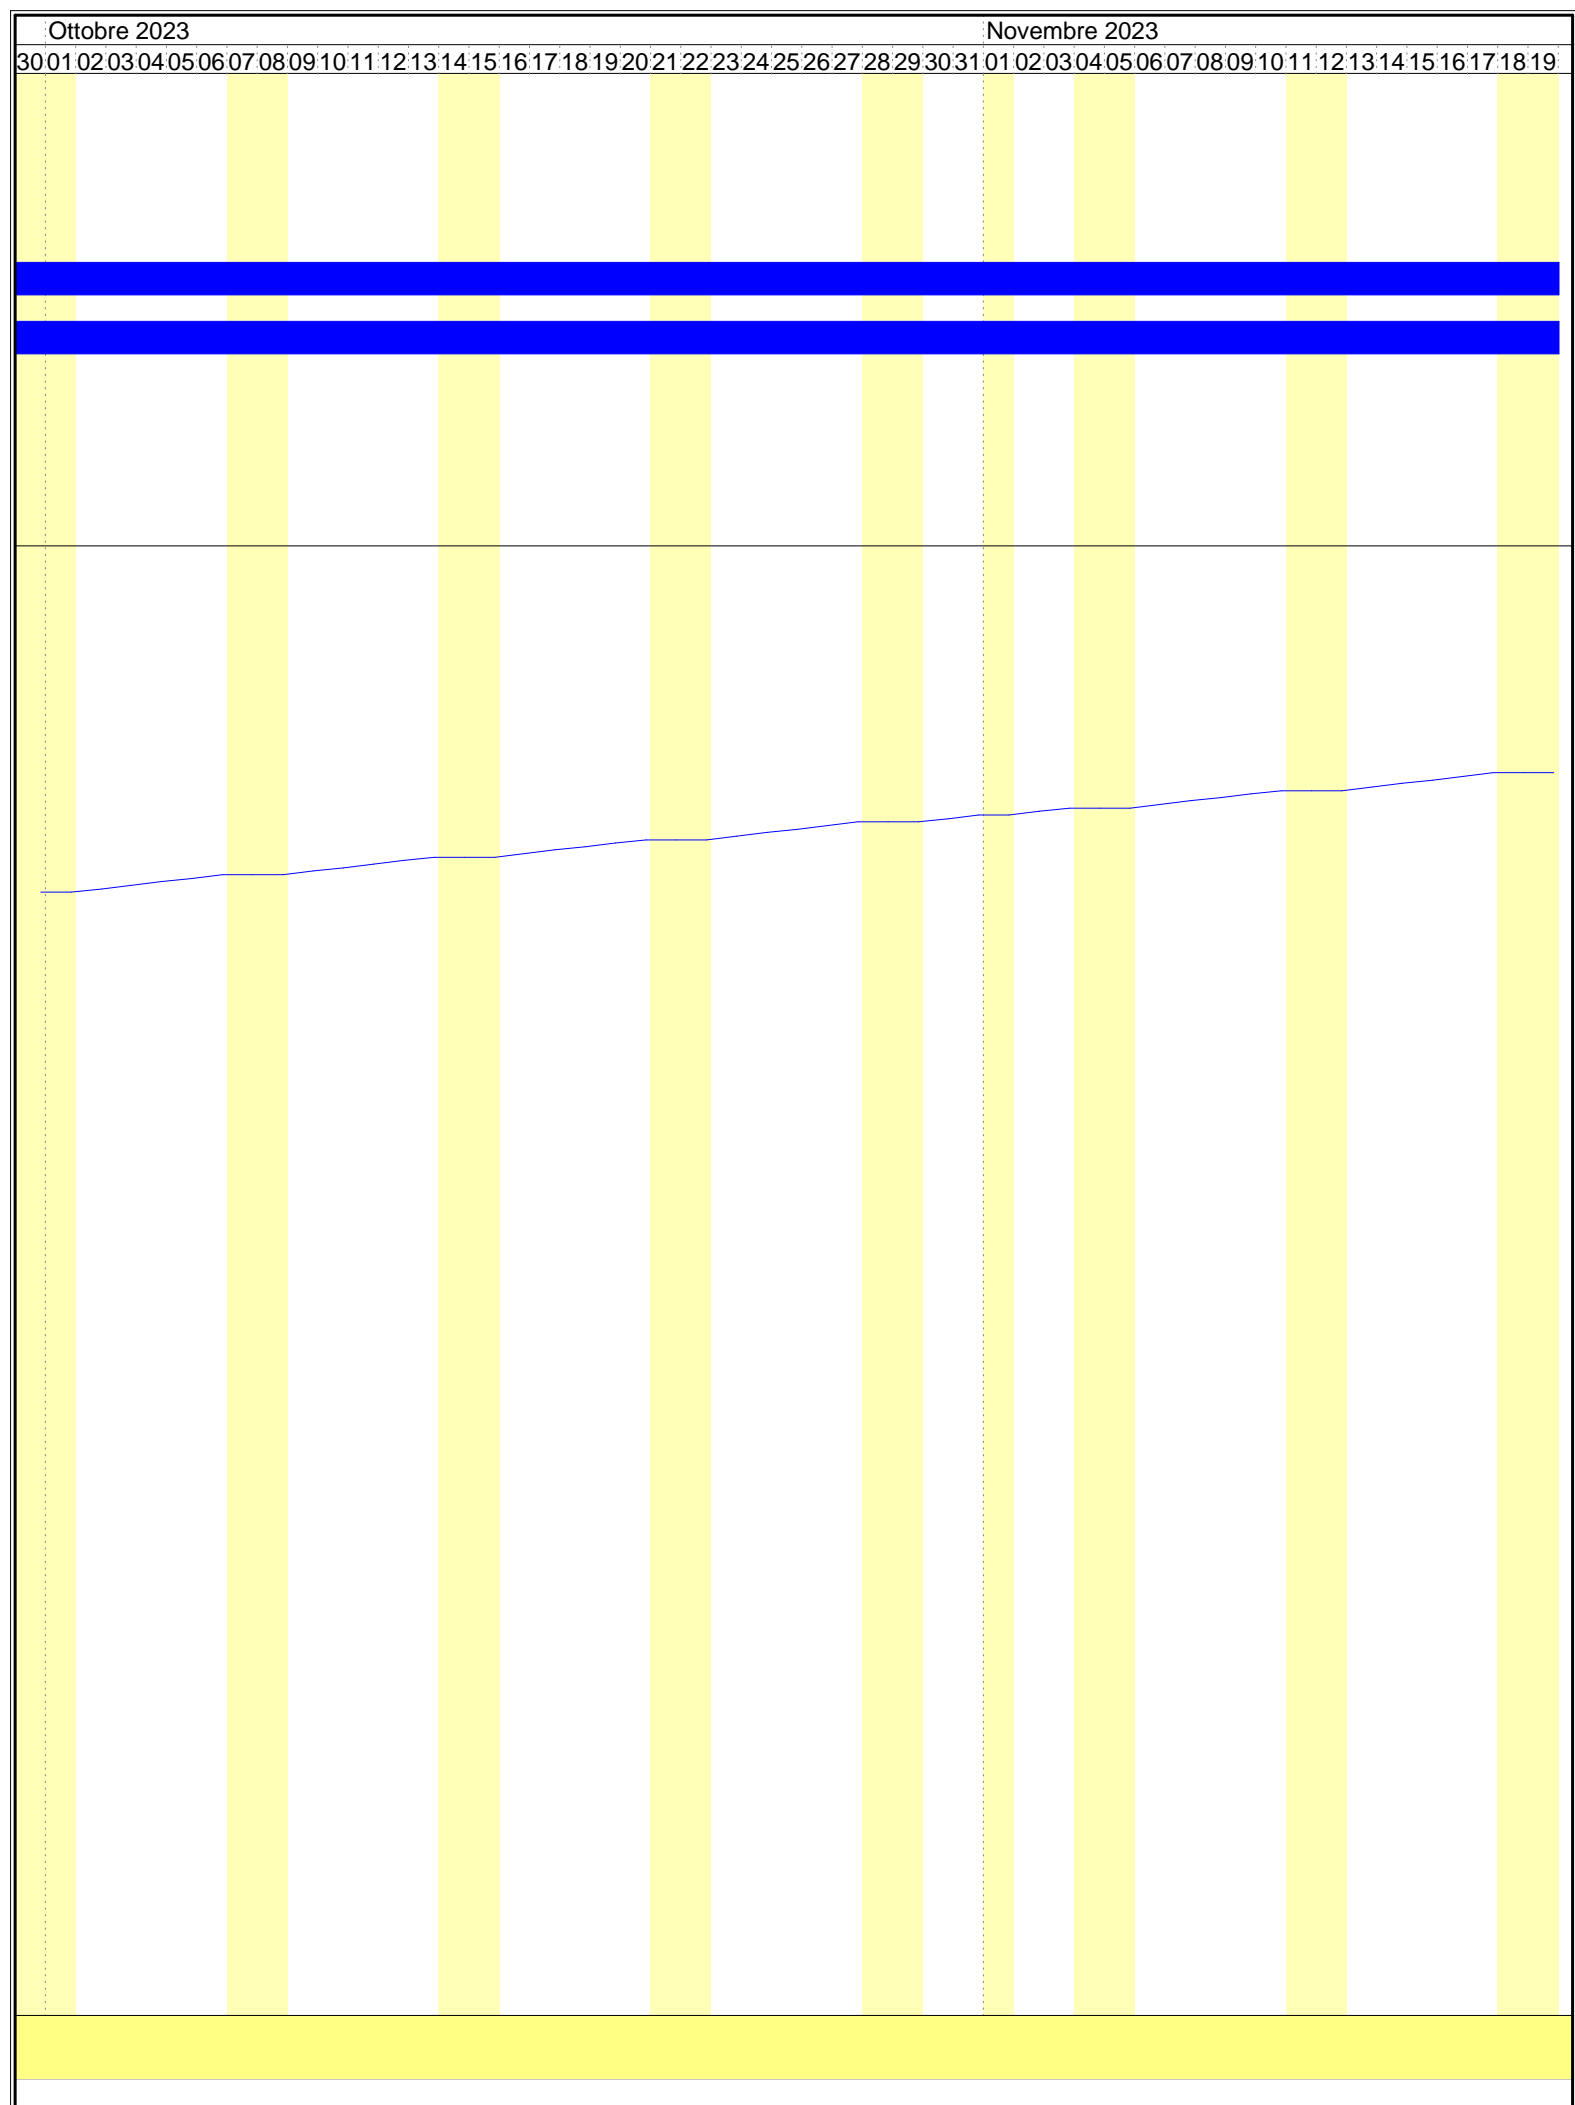

[illegible]

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
01	TRAMEZZATURE	A corpo	1	6 493.14	6 493.14	11/04/2023	08/06/2023	40
02	FINITURE E TINTEGGIATURE	A corpo	1	25 738.38	25 738.38	24/04/2023	29/06/2023	46
03	POSA DI PAVIMENTAZIONI	A corpo	1	16 991.21	16 991.21	29/05/2023	28/07/2023	44
05	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	A corpo	1	24 092.38	24 092.38	07/07/2023	04/12/2023	105
04	IMPIANTI ELETTRICO, DI ILLUMINAZIONE E TRASMISSIONE DATI	A corpo	1	6 821.93	6 821.93	12/05/2023	06/12/2023	146
07	POSA DI INFISSI	A corpo	1	11 945.33	11 945.33	12/07/2023	19/08/2023	27
08	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	A	1	1 657.00	1 657.00	19/04/2023	26/06/2023	46
06	IMPIANTO IDRICO SANITARIO	A corpo	1	7 121.70	7 121.70	26/06/2023	04/08/2023	30
